Proyecto Hotel de Mascotas

Cronograma,
gestión de tiempo
y gestión de costos

Profesor:

Jaime Solano Soto

Miembros:

Brendan Ramírez Campos
Sebastián Guillén Guzmán
Kevin Espinoza
José Gabriel Marín Aguilar

Fecha de entrega:
Viernes 27 de marzo de 2026

Enfoque de gestión de costos 2
Tabla de Actividades del Proyecto 2
1. Gestión del Proyecto - Inicio y Planificación 2
2. Seguimiento, Control y Cierre del Proyecto 3
3. Análisis y Diseño del Sistema 4
4. Configuración del Entorno de Desarrollo 5
5. Desarrollo de Base de Datos 5
6. Desarrollo de Aplicación Móvil (Android) 6
7. Desarrollo de Plataforma Web y Backend 7
8. Sistema de Notificaciones 7
9. Pruebas del Sistema 8
10. Despliegue del Sistema 8
11. Documentación y Capacitación 8
Valores totales por actividad padre y valor total del proyecto 8
Hoja de recursos 9
Estrategia de gestión de adquisiciones (infraestructura y terceros) 9
Flujo de efectivo (estimación de costos en el tiempo) 10
Gestión de incertidumbre del costo 11
Reserva de contingencia 11
Supuestos que pueden variar durante el proyecto 11
Riesgos de costo del proyecto 12
Acciones ante cambios en tarifas, alcance o duración 12
Descripción de técnica(s) de estimación de costo 13
Uso del tipo de moneda 13
Cronograma y Gestión de Tiempo 13
Diagrama de red 13
Diagramas de Gantt 14

Enfoque de gestión de costos

El enfoque de gestión de costos de este proyecto se basa en la planificación proactiva y el monitoreo continuo. Se ha establecido un presupuesto detallado a nivel de WBS asignando tarifas diarias a los recursos responsables. El control se realizará mediante la medición del avance real frente a los costos acumulados planificados, evaluando desviaciones en cada hito para aplicar acciones correctivas oportunas.

Tabla de Actividades del Proyecto

Las fechas de inicio y finalización se pueden visualizar en la sección del diagrama de Gantt por motivos de espacio en la tabla.

1. Gestión del Proyecto - Inicio y Planificación

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A1	Elaborar el Project Charter	—	1	Director	$150	$150
A2	Identificar a los stakeholders iniciales	A1	1	Director	$150	$300
A3	Definir los objetivos del proyecto	A2	1	Director	$150	$450
A4	Definir el alcance preliminar del proyecto	A3	1	Director	$150	$600
A5	Aprobar el proyecto por parte de los patrocinadores	A4	1	Director	$150	$750
A6	Elaborar el ERS	A5	2	Analista	$240	$990
A7	Revisar el ERS con el cliente	A6	1	Cliente	$100	$1090
A8	Aprobar el ERS por parte del cliente	A7	1	Cliente	$100	$1190
A9	Definir el alcance detallado del proyecto	A8	1	Director	$150	$1340
A10	Crear la WBS del proyecto	A9	1	Director	$150	$1490
A11	Definir el cronograma del proyecto	A10	1	Director	$150	$1640
A12	Identificar los hitos del proyecto	A11	1	Director	$150	$1790
A13	Estimar los recursos humanos del proyecto	A12	1	Director	$150	$1940
A14	Estimar los costos del proyecto	A13	1	Director	$150	$2090
A15	Elaborar el presupuesto del proyecto	A14	1	Director	$150	$2240
A16	Definir los roles y responsabilidades del equipo	A15	1	Director	$150	$2390
A17	Definir el plan de gestión de riesgos	A16	1	Director	$150	$2540
A18	Definir el plan de comunicaciones del proyecto	A17	1	Director	$150	$2690
A19	Definir el plan de gestión de calidad	A18	1	Director	$150	$2840
A20	Definir el plan de gestión de configuración	A19	1	Director	$150	$2990

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A21	Definir el plan de gestión de cambios	A20	1	Director	$150	$3140

2. Seguimiento, Control y Cierre del Proyecto

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A22	Monitorear el progreso del proyecto	A21	5	Director	$750	$3890
A23	Gestionar el control del cronograma	A22	2	Director	$300	$4190
A24	Gestionar el control de costos	A23	2	Director	$300	$4490
A25	Gestionar el control del alcance	A24	2	Director	$300	$4790
A26	Gestionar el seguimiento de riesgos	A25	2	Director	$300	$5090
A27	Definir las reuniones semanales del equipo	A26	5	Director	$750	$5840
A28	Definir los reportes de avance al profesor	A27	3	Director	$450	$6290
A29	Gestionar el control de versiones del proyecto	A28	2	DevOps	$300	$6590
A30	Gestionar las incidencias del proyecto	A29	3	QA	$450	$7040
A31	Gestionar el testeo privado del sistema	A30	3	QA	$450	$7490
A32	Gestionar el testeo público real del sistema	A31	3	QA	$450	$7940
A33	Verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto	A32	1	Director	$150	$8090
A34	Validar los entregables finales del proyecto	A33	1	Director	$150	$8240
A35	Documentar el cierre final del proyecto	A34	2	Analista	$240	$8480
A36	Presentar el sistema final a los stakeholders	A35	1	Director	$150	$8630
A37	Registrar las lecciones aprendidas del proyecto	A36	1	Director	$150	$8780
A38	Ejecutar el cierre administrativo del proyecto	A37	1	Director	$150	$8930

3. Análisis y Diseño del Sistema

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A39	Identificar los requerimientos funcionales del sistema	A8	2	Analista	$240	$9170
A40	Identificar los requerimientos no funcionales del sistema	A39	2	Analista	$240	$9410
A41	Analizar el dominio del negocio	A40	2	Analista	$240	$9650
A42	Identificar los actores del sistema	A41	1	Analista	$120	$9770
A43	Definir los casos de uso del sistema	A42	2	Analista	$240	$10010
A44	Elaborar los diagramas de casos de uso	A43	2	Analista	$240	$10250
A45	Diseñar la arquitectura general del sistema	A44	2	Arquitecto	$300	$10550
A46	Definir la arquitectura MVC para la plataforma web	A45	1	Arquitecto	$150	$10700
A47	Definir la arquitectura cliente-servidor	A46	1	Arquitecto	$150	$10850
A48	Diseñar los componentes del sistema	A47	2	Arquitecto	$300	$11150
A49	Definir la API del backend	A48	2	Backend	$300	$11450
A50	Diseñar la UX de la aplicación móvil	A49	2	Frontend	$300	$11750
A51	Diseñar la UX de la plataforma web administrativa	A50	2	Frontend	$300	$12050
A52	Crear los wireframes del sistema	A51	2	Frontend	$300	$12350
A53	Crear los mockups del sistema	A52	2	Frontend	$300	$12650
A54	Validar el diseño de interfaz con los stakeholders	A53	1	Frontend	$150	$12800

4. Configuración del Entorno de Desarrollo

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A55	Instalar los IDEs de desarrollo del equipo	A54	1	DevOps	$150	$12950
A56	Instalar el SDK de Android	A55	1	Dev Mobile	$150	$13100
A57	Instalar las herramientas de desarrollo web	A56	1	Frontend	$150	$13250
A58	Configurar el servidor de desarrollo	A57	1	DevOps	$150	$13400

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A59	Crear el repositorio del proyecto en GitHub	A58	1	DevOps	$120	$13520
A60	Configurar el control de versiones del repositorio	A59	1	DevOps	$120	$13640
A61	Definir las ramas de desarrollo del proyecto	A60	1	DevOps	$120	$13760
A62	Configurar la integración del equipo en el repositorio	A61	1	DevOps	$120	$13880
A63	Configurar el gestor de tareas del equipo	A62	1	DevOps	$120	$14000
A64	Configurar el almacenamiento de documentos del proyecto	A63	1	DevOps	$120	$14120
A65	Configurar los canales de comunicación del equipo	A64	1	DevOps	$120	$14240

5. Desarrollo de Base de Datos

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A66	Identificar las entidades del sistema	A49	2	DBA	$240	$14480
A67	Diseñar el modelo entidad-relación	A66	2	DBA	$240	$14720
A68	Normalizar las tablas de la base de datos	A67	2	DBA	$240	$14960
A69	Definir las relaciones entre entidades	A68	1	DBA	$120	$15080
A70	Diseñar la lógica de la base de datos	A69	1	DBA	$120	$15200
A71	Diseñar la sección física de la base de datos	A70	1	DBA	$120	$15320
A72	Crear la base de datos en el entorno de desarrollo	A71	1	DBA	$120	$15440
A73	Crear las tablas principales del sistema	A72	2	DBA	$240	$15680
A74	Crear las relaciones entre tablas	A73	1	DBA	$120	$15800
A75	Crear los procedimientos almacenados	A74	2	DBA	$240	$16040
A76	Crear los triggers del sistema	A75	2	DBA	$240	$16280
A77	Implementar las restricciones de integridad	A76	1	DBA	$120	$16400
A78	Implementar las validaciones de datos	A77	1	DBA	$120	$16520
A79	Ejecutar las pruebas de la base de datos	A78	2	QA	$240	$16760

6. Desarrollo de Aplicación Móvil (Android)

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A80	Crear el proyecto Android	A65	1	Dev Mobile	$200	$16960
A81	Configurar las dependencias de la aplicación	A80	1	Dev Mobile	$200	$17160
A82	Configurar la arquitectura de la aplicación móvil	A81	1	Dev Mobile	$200	$17360
A83	Desarrollar la pantalla de registro de usuario	A82	2	Dev Mobile	$400	$17760
A84	Implementar la validación de datos del usuario	A83	1	Dev Mobile	$200	$17960
A85	Implementar la autenticación del usuario	A84	2	Dev Mobile	$400	$18360
A86	Desarrollar la edición del perfil de usuario	A85	2	Dev Mobile	$400	$18760
A87	Desarrollar el módulo de registro de mascotas	A86	2	Dev Mobile	$400	$19160
A88	Desarrollar el módulo de reservas	A87	3	Dev Mobile	$600	$19760
A89	Desarrollar el módulo de historial de reservas	A88	2	Dev Mobile	$400	$20160
A90	Desarrollar el centro de notificaciones en la app	A89	2	Dev Mobile	$400	$20560
A91	Ejecutar las pruebas de la aplicación móvil	A90	3	QA	$450	$21010

7. Desarrollo de Plataforma Web y Backend

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A92	Implementar la API REST del backend	A65	3	Backend	$600	$21610
A93	Desarrollar la autenticación del backend	A92	2	Backend	$400	$22010
A94	Implementar la gestión de usuarios en el backend	A93	3	Backend	$600	$22610
A95	Implementar la gestión de mascotas en el backend	A94	2	Backend	$400	$23010
A96	Implementar la gestión de reservas en el backend	A95	3	Backend	$600	$23610
A97	Desarrollar el panel administrativo web	A96	3	Frontend	$600	$24210
A98	Implementar la gestión de ocupación del hotel	A97	2	Frontend	$400	$24610
A99	Desarrollar el módulo de monitoreo de hospedaje	A98	2	Frontend	$400	$25010

8. Sistema de Notificaciones

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A100	Configurar la integración con el servidor SMTP	A92	2	Backend	$400	$25410
A101	Desarrollar las plantillas de correo del sistema	A100	2	Backend	$400	$25810
A102	Implementar la automatización de notificaciones	A101	2	Backend	$400	$26210

9. Pruebas del Sistema

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A103	Definir los casos de prueba del sistema	A99	2	QA	$300	$26510
A104	Ejecutar las pruebas funcionales del sistema	A103	3	QA	$450	$26960
A105	Ejecutar las pruebas de integración del sistema	A104	3	QA	$450	$27410
A106	Ejecutar las pruebas de rendimiento del sistema	A105	2	QA	$300	$27710
A107	Corregir los errores identificados en las pruebas	A106	3	Dev	$600	$28310

10. Despliegue del Sistema

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A108	Configurar el servidor de producción	A107	2	DevOps	$400	$28710
A109	Desplegar el sistema en el entorno de producción	A108	2	DevOps	$400	$29110
A110	Validar el sistema en el entorno de producción	A109	2	QA	$300	$29410

11. Documentación y Capacitación

ID	Actividad	Predecesora	Duración (días)	Responsable	Costo ($)	Acumulado ($)
A111	Elaborar la documentación técnica del sistema	A107	3	Analista	$450	$29860
A112	Elaborar el manual de usuario del sistema	A111	2	Analista	$300	$30160
A113	Ejecutar la capacitación a los administradores y personal	A112	2	Director	$300	$30460

Valores totales por actividad padre y valor total del proyecto

A partir de la columna de costo y los acumulados de las tareas, estos son los subtotales para cada actividad padre, es decir, las 11 fases, y el gran total:

- 1. Gestión del Proyecto - Inicio y Planificación: $3,140
- 2. Seguimiento, Control y Cierre del Proyecto: $5,790
- 3. Análisis y Diseño del Sistema: $3,870
- 4. Configuración del Entorno de Desarrollo: $1,440
- 5. Desarrollo de Base de Datos: $2,520
- 6. Desarrollo de Aplicación Móvil (Android): $4,250
- 7. Desarrollo de Plataforma Web y Backend: $4,000
- 8. Sistema de Notificaciones: $1,200
- 9. Pruebas del Sistema: $2,100
- 10. Despliegue del Sistema: $1,100
- 11. Documentación y Capacitación: $1,050
- **Valor Total del Proyecto: $30,460**

Hoja de recursos

Nombre de recurso	Categoría	Detalle Técnico	Costo
Director	Trabajo	Director de Proyecto / Project Manager	$150/día
Analista	Trabajo	Analista de Requerimientos y Sistemas	$120/día
Cliente	Trabajo	Stakeholder / Validador	$100/día
Arquitecto	Trabajo	Arquitecto de Software	$150/día
Frontend	Trabajo	Desarrollador Frontend / UI-UX	$150 - $200/día
Backend	Trabajo	Desarrollador Backend	$150 - $200/día
DBA	Trabajo	Administrador de Base de Datos	$120/día
Dev Mobile	Trabajo	Desarrollador Android	$200/día
DevOps	Trabajo	Ingeniero de Infraestructura / Despliegue	$120 - $200/día
QA	Trabajo	Analista de Calidad / Tester	$120 - $150/día
Dev	Trabajo	Desarrollador General / Soporte	$200/día

Estrategia de gestión de adquisiciones (infraestructura y terceros)

La estrategia de adquisiciones se enfocará en contrataciones de precio fijo para servicios en la nube e infraestructura de servidores necesarios para el despliegue. Para las herramientas de software (IDEs, licencias de repositorios o bases de datos), se optará por suscripciones de pago por uso (SaaS) durante la vida del proyecto para minimizar costos de capital inicial.

Todas estas compras serán validadas por el Project Manager según los umbrales de costo definidos en el plan, su rol consistirá en evaluar cada solicitud y asegurarse de que no supere los umbrales de costo previamente definidos en el plan de gestión. Este filtro de aprobación garantiza que cualquier gasto en herramientas o infraestructura esté plenamente justificado y alineado con los objetivos financieros trazados desde el inicio.

Flujo de efectivo (estimación de costos en el tiempo)

El flujo de efectivo del proyecto se ha representado mediante la curva de costo acumulado a lo largo de los 11 hitos principales establecidos en el cronograma. El desglose de las fases es el siguiente:

1. **Arranque con alta inversión (Fases 1 a la 3):** A diferencia de proyectos tradicionales que inician con costos muy bajos, nuestro gráfico muestra una inclinación pronunciada desde el primer hito. Esto se debe a que las fases de Gestión del Proyecto, Control y Análisis y Diseño exigen un esfuerzo intensivo e inmediato por parte de los recursos de mayor tarifa (Director del Proyecto, Arquitecto y Analista). Al finalizar el diseño del sistema (Hito 3), el proyecto ya ha consumido una base de $12,800 del presupuesto total.

2. **Crecimiento sostenido durante la ejecución (Fases 4 a la 8):** Durante las etapas técnicas (Desarrollo de Base de Datos, Aplicación Móvil, Plataforma Web y Notificaciones), el gráfico mantiene una pendiente constante de crecimiento.

En este bloque se integran los desarrolladores especializados (Backend, Frontend, DBA y Dev Mobile), elevando el costo acumulado de manera firme hasta alcanzar los $26,210 al finalizar la fase de desarrollo duro.

3. **Estabilización hacia el cierre (Fases 9 a la 11):** Es a partir de la fase de Pruebas del Sistema donde la curva comienza a aplanarse. Las actividades de despliegue, documentación y capacitación final requieren menos recursos en paralelo y tienen duraciones más cortas, lo que desacelera significativamente el ritmo de gasto hasta alcanzar la línea base de costo total del proyecto de $30,460.

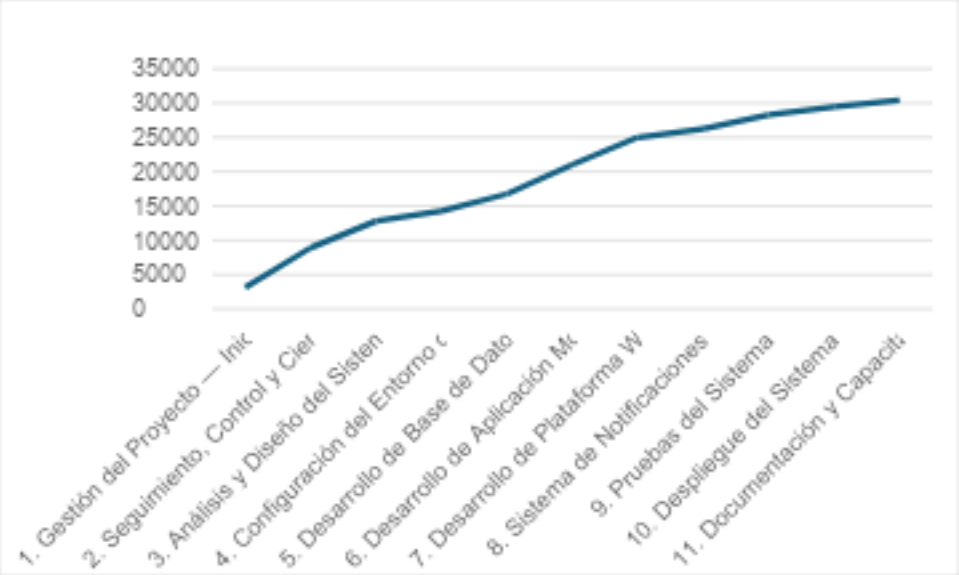

Gestión de incertidumbre del costo

Reserva de contingencia

Debido a la incertidumbre inherente al proyecto, se establecerá una reserva de contingencia destinada a cubrir eventos identificados que puedan afectar el costo y la duración del cronograma, tales como retrasos en desarrollo, reprocesos por errores, ajustes en requerimientos, indisponibilidad temporal de miembros del equipo o dificultades técnicas en integración y despliegue.

Dado que el proyecto se desarrolla dentro de un calendario académico y con recursos limitados, se recomienda establecer una reserva de contingencia equivalente a un 10% del

costo base del proyecto. Considerando un costo total estimado de $30,460, la reserva sugerida sería de **$3,046**, para un presupuesto ajustado de **$33,506**.

Esta reserva no será utilizada de forma automática, sino únicamente cuando un riesgo identificado se materialice y su uso sea validado por el Project Manager.

Supuestos que pueden variar durante el proyecto

El proyecto fue estimado bajo varios supuestos que podrían modificarse durante su ejecución y afectar tiempo y costo. Entre los principales supuestos se encuentran:

- Que todos los miembros del equipo mantendrán disponibilidad constante durante el semestre.
- Que el cliente o stakeholders responderán oportunamente a validaciones y aprobaciones.
- Que el desarrollo de la app Android podrá realizarse sin curvas de aprendizaje mayores a las previstas.
- Que el hosting gratuito y los servicios de correo estarán disponibles durante pruebas y despliegue.
- Que no surgirán cambios significativos en el alcance funcional mínimo establecido por el curso.
- Que las herramientas de trabajo colaborativo y repositorio estarán disponibles sin interrupciones.

Si alguno de estos supuestos cambia, el cronograma y el presupuesto deberán revisarse para reflejar el impacto en duración, esfuerzo o costo.

Riesgos de costo del proyecto

Los principales riesgos que podrían impactar el costo del proyecto son:

- Reprocesos por errores funcionales o técnicos detectados en pruebas.
- Retrasos por curva de aprendizaje en tecnologías del desarrollo móvil Android.
- Cambios de alcance solicitados por stakeholders o ajustes para cumplir requerimientos académicos.
- Necesidad de dedicar más tiempo del estimado a integración entre móvil, backend, base de datos y notificaciones.
- Problemas en el despliegue o en la configuración de infraestructura gratuita.
- Incremento en el esfuerzo de documentación, capacitación o corrección final.
- Indisponibilidad temporal de recursos clave del equipo, generando redistribución de trabajo y mayor esfuerzo de otros miembros.

Estos riesgos podrían generar incrementos en los costos de trabajo, principalmente en actividades de desarrollo, pruebas, despliegue y documentación.

Acciones ante cambios en tarifas, alcance o duración

Si durante la ejecución del proyecto cambian las tarifas de los recursos, el alcance o la duración estimada de las actividades, el Project Manager deberá realizar una reevaluación del presupuesto y del cronograma.

Las acciones previstas son:

- **Si cambian las tarifas:** recalcular los costos de las actividades afectadas y actualizar el costo total del proyecto.
- **Si cambia el alcance:** analizar el impacto del cambio sobre duración, recursos y costo antes de aprobarlo.
- **Si cambia la duración de actividades:** ajustar el cronograma, identificar impacto en la ruta crítica y recalcular el costo derivado del mayor o menor esfuerzo.
- **Si el cambio afecta hitos clave:** presentar la variación al cliente para aprobación y documentar la nueva línea base.

Todo cambio deberá seguir el proceso de control de cambios definido en el proyecto, evaluando primero su impacto en tiempo, costo y recursos antes de ser aprobado.

Descripción de técnica(s) de estimación de costo

Se utilizaron principalmente dos técnicas:

1. **Estimación Ascendente (Bottom-Up):** Se desglosó el proyecto en actividades individuales muy específicas (nivel más bajo del cronograma). Se estimó el costo de cada tarea por separado y luego se sumaron para obtener los costos de cada fase y, finalmente, el costo total del proyecto.

2. **Estimación Paramétrica:** El costo de cada actividad individual se calculó multiplicando la duración estimada de la tarea (en días) por la tarifa diaria (en dólares) del recurso responsable.

Uso del tipo de moneda

Tal como se estableció en la tabla de actividades, todas las estimaciones, cálculo de tarifas de recursos y totales consolidados se han expresado en Dólares Estadounidenses (USD - $).

Cronograma y Gestión de Tiempo

El cronograma y sus respectivos diagramas fueron realizados utilizando como guía la Tabla de Actividades mostrada anteriormente. Este fue realizado utilizando la herramienta GanttProject, y la cual se recomienda su uso para una mejor visualización del cronograma realizado.

Diagrama de red

Para visualizar mejor el diagrama de red (debido a la gran cantidad de actividades), puede visualizarlo en el siguiente archivo compartido: Diagrama de Red

Diagramas de Gantt

Para visualizar de mejor manera este archivo, se adjuntan tanto el archivo en formato .csv, como en formato .gan (en caso de que se cuente con la herramienta GanttProject, con la cual podrá obtener la vista e información, como las respectivas responsabilidades, que se mostrará en las imágenes a continuación):

- Archivo CSV
- Archivo GanttProject
- Otras vistas (pdf, mpx)

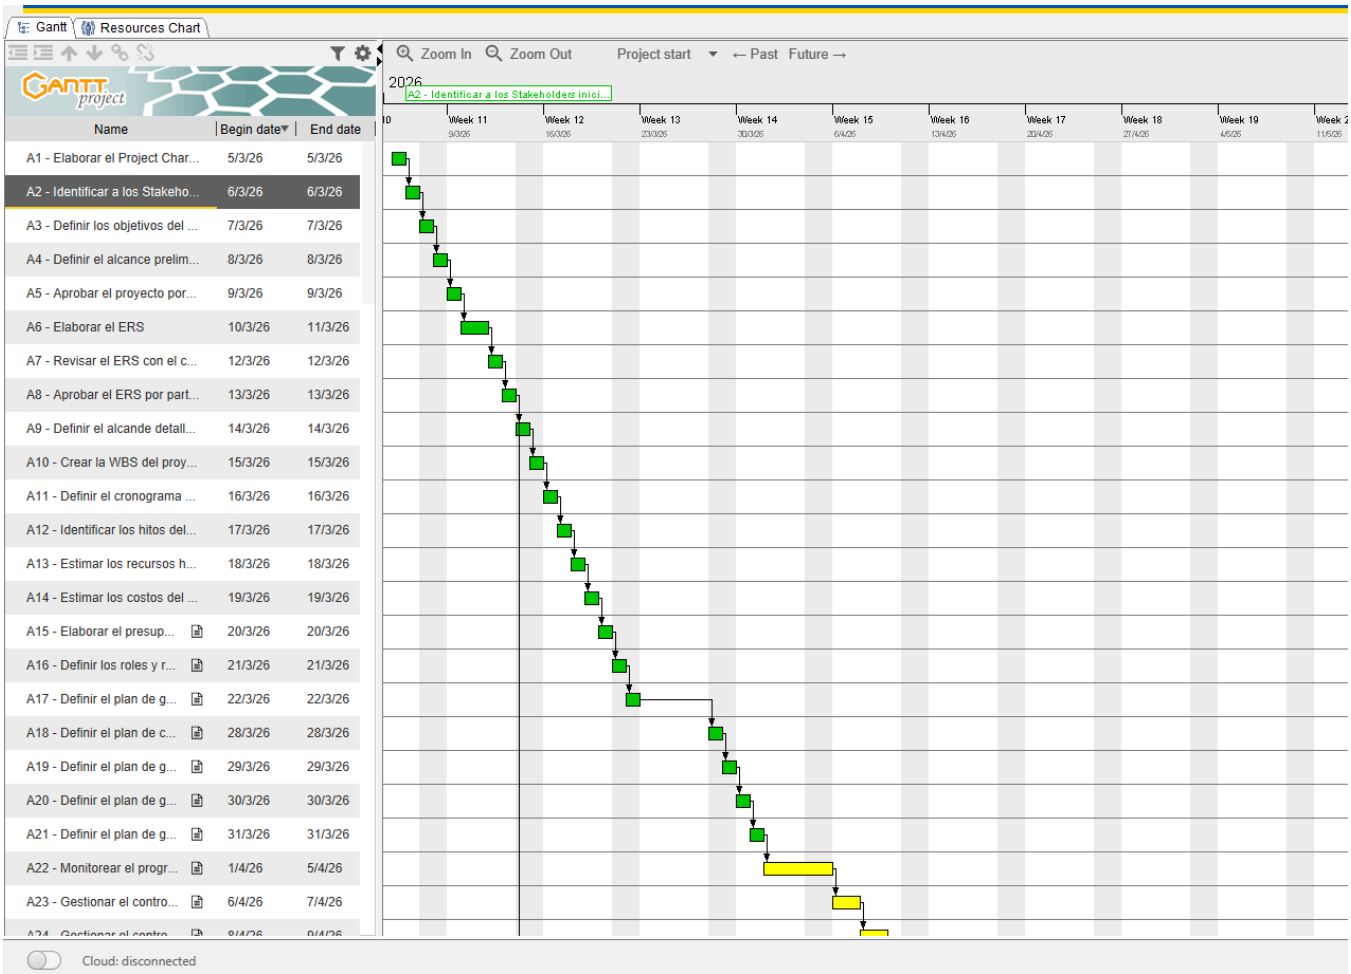
Gantt
Resources Chart
Zoom In
Zoom Out
Project start
← Past
Future →
2026
A2 - Identificar a los Stakeholders inici...
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Name
Begin date
End date
A1 - Elaborar el Project Char... 5/3/26 5/3/26
A2 - Identificar a los Stakeho... 6/3/26 6/3/26
A3 - Definir los objetivos del ... 7/3/26 7/3/26
A4 - Definir el alcance prelim... 8/3/26 8/3/26
A5 - Aprobar el proyecto por... 9/3/26 9/3/26
A6 - Elaborar el ERS 10/3/26 11/3/26
A7 - Revisar el ERS con el c... 12/3/26 12/3/26
A8 - Aprobar el ERS por part... 13/3/26 13/3/26
A9 - Definir el alcande detall... 14/3/26 14/3/26
A10 - Crear la WBS del proy... 15/3/26 15/3/26
A11 - Definir el cronograma ... 16/3/26 16/3/26
A12 - Identificar los hitos del... 17/3/26 17/3/26
A13 - Estimar los recursos h... 18/3/26 18/3/26
A14 - Estimar los costos del ... 19/3/26 19/3/26
A15 - Elaborar el presup... 20/3/26 20/3/26
A16 - Definir los roles y r... 21/3/26 21/3/26
A17 - Definir el plan de g... 22/3/26 22/3/26
A18 - Definir el plan de c... 28/3/26 28/3/26
A19 - Definir el plan de g... 29/3/26 29/3/26
A20 - Definir el plan de g... 30/3/26 30/3/26
A21 - Definir el plan de g... 31/3/26 31/3/26
A22 - Monitorear el progr... 1/4/26 5/4/26
A23 - Gestionar el contro... 6/4/26 7/4/26
Cloud: disconnected

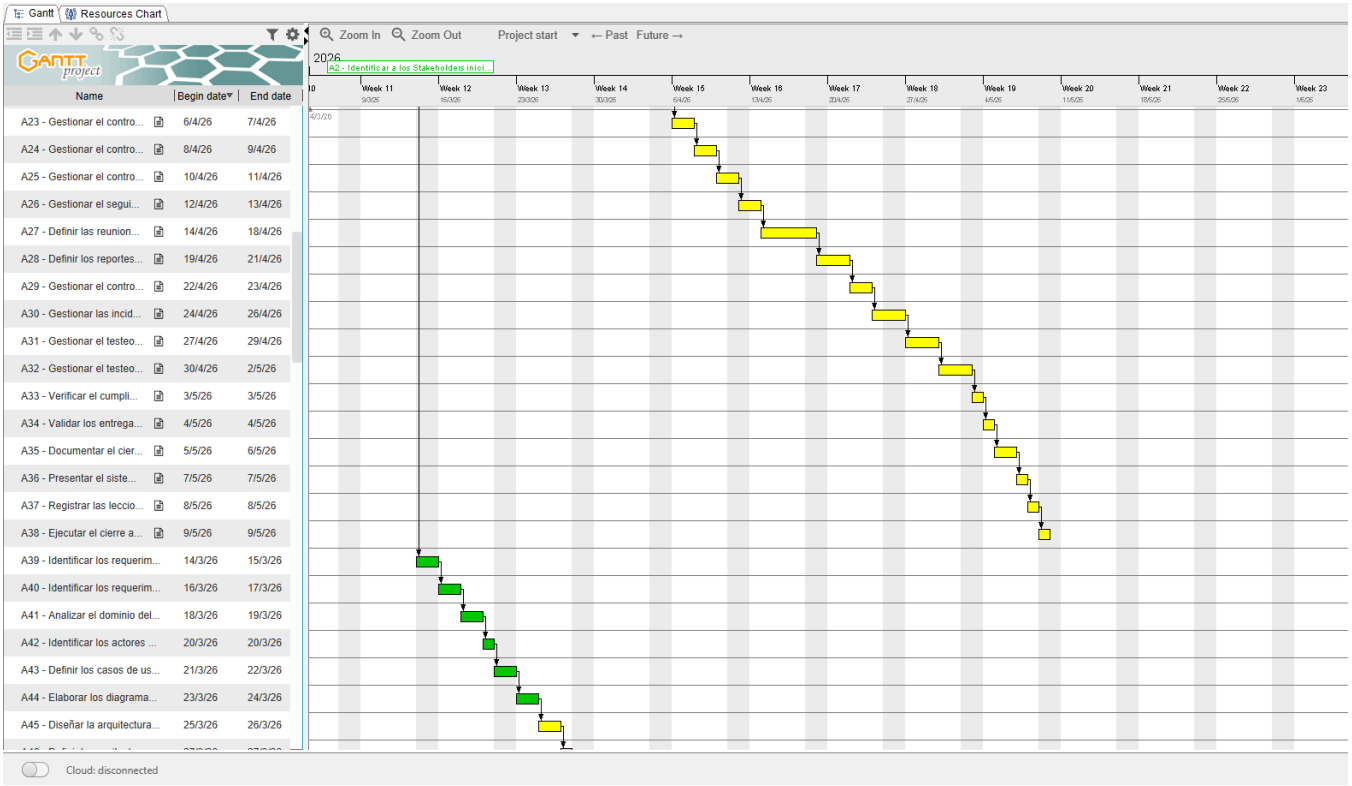
Gantt
Resources Chart
Zoom In
Zoom Out
Project start
← Past
Future →
2026
A2 - Identificar a los Stakeholders inici...
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22
Week 23
Name
Begin date
End date
A23 - Gestionar el contro... 6/4/26 7/4/26
A24 - Gestionar el contro... 8/4/26 9/4/26
A25 - Gestionar el contro... 10/4/26 11/4/26
A26 - Gestionar el segui... 12/4/26 13/4/26
A27 - Definir las reunion... 14/4/26 18/4/26
A28 - Definir los reportes... 19/4/26 21/4/26
A29 - Gestionar el contro... 22/4/26 23/4/26
A30 - Gestionar las incid... 24/4/26 26/4/26
A31 - Gestionar el testeo... 27/4/26 29/4/26
A32 - Gestionar el testeo... 30/4/26 2/5/26
A33 - Verificar el cumpli... 3/5/26 3/5/26
A34 - Validar los entrega... 4/5/26 4/5/26
A35 - Documentar el cier... 5/5/26 6/5/26
A36 - Presentar el siste... 7/5/26 7/5/26
A37 - Registrar las leccio... 8/5/26 8/5/26
A38 - Ejecutar el cierre a... 9/5/26 9/5/26
A39 - Identificar los requerim... 14/3/26 15/3/26
A40 - Identificar los requerim... 16/3/26 17/3/26
A41 - Analizar el dominio del... 18/3/26 19/3/26
A42 - Identificar los actores ... 20/3/26 20/3/26
A43 - Definir los casos de us... 21/3/26 22/3/26
A44 - Elaborar los diagrama... 23/3/26 24/3/26
A45 - Diseñar la arquitectura... 25/3/26 26/3/26
Cloud: disconnected

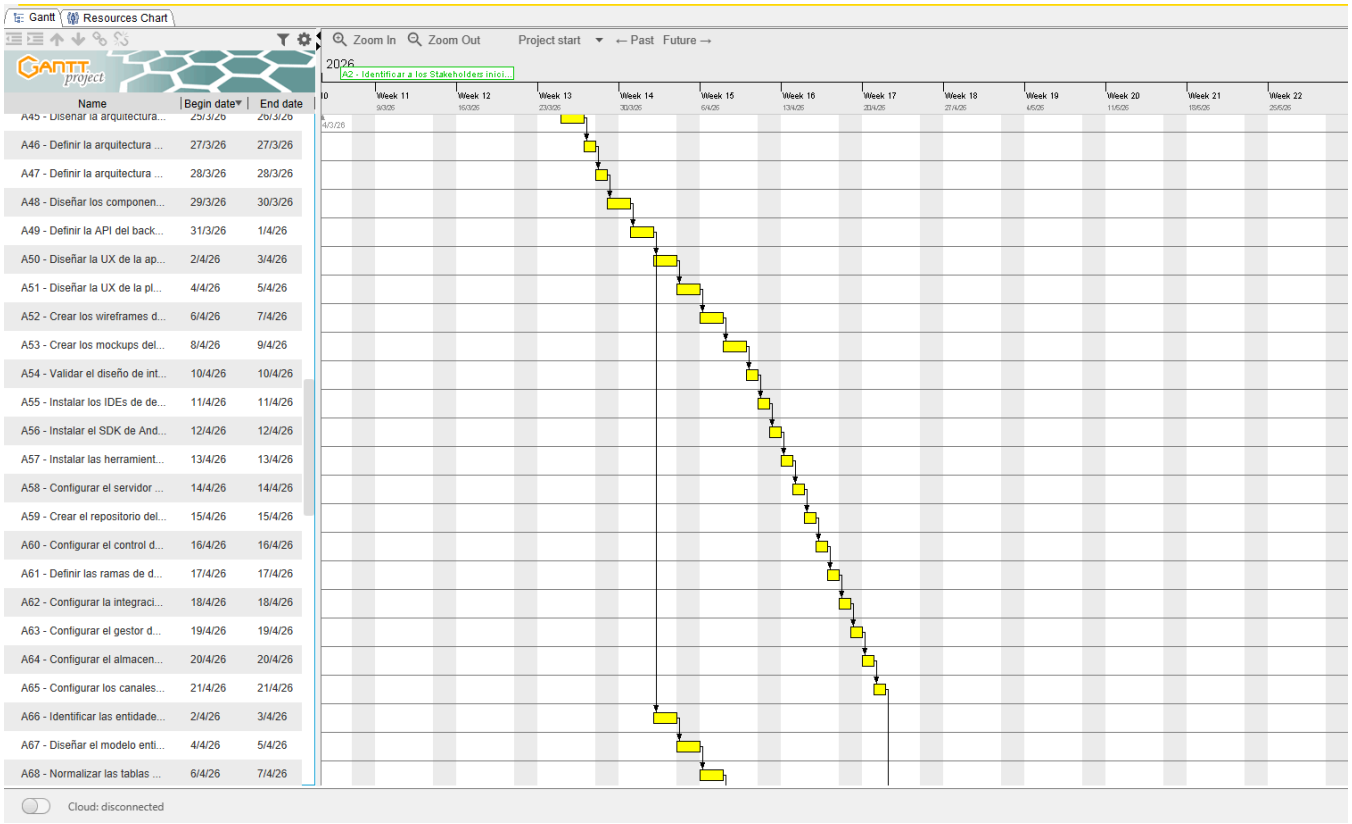
Gantt
Resources Chart
Zoom In
Zoom Out
Project start
← Past
Future →
2026
A2 - Identificar a los Stakeholders inici...
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22
Name
Begin date
End date
A45 - Diseñar la arquitectura... 25/3/26 26/3/26
A46 - Definir la arquitectura ... 27/3/26 27/3/26
A47 - Definir la arquitectura ... 28/3/26 28/3/26
A48 - Diseñar los componen... 29/3/26 30/3/26
A49 - Definir la API del back... 31/3/26 1/4/26
A50 - Diseñar la UX de la ap... 2/4/26 3/4/26
A51 - Diseñar la UX de la pl... 4/4/26 5/4/26
A52 - Crear los wireframes d... 6/4/26 7/4/26
A53 - Crear los mockups del... 8/4/26 9/4/26
A54 - Validar el diseño de int... 10/4/26 10/4/26
A55 - Instalar los IDEs de de... 11/4/26 11/4/26
A56 - Instalar el SDK de And... 12/4/26 12/4/26
A57 - Instalar las herramient... 13/4/26 13/4/26
A58 - Configurar el servidor ... 14/4/26 14/4/26
A59 - Crear el repositorio del... 15/4/26 15/4/26
A60 - Configurar el control d... 16/4/26 16/4/26
A61 - Definir las ramas de d... 17/4/26 17/4/26
A62 - Configurar la integraci... 18/4/26 18/4/26
A63 - Configurar el gestor d... 19/4/26 19/4/26
A64 - Configurar el almacen... 20/4/26 20/4/26
A65 - Configurar los canales... 21/4/26 21/4/26
A66 - Identificar las entidade... 2/4/26 3/4/26
A67 - Diseñar el modelo enti... 4/4/26 5/4/26
A68 - Normalizar las tablas ... 6/4/26 7/4/26
Cloud: disconnected

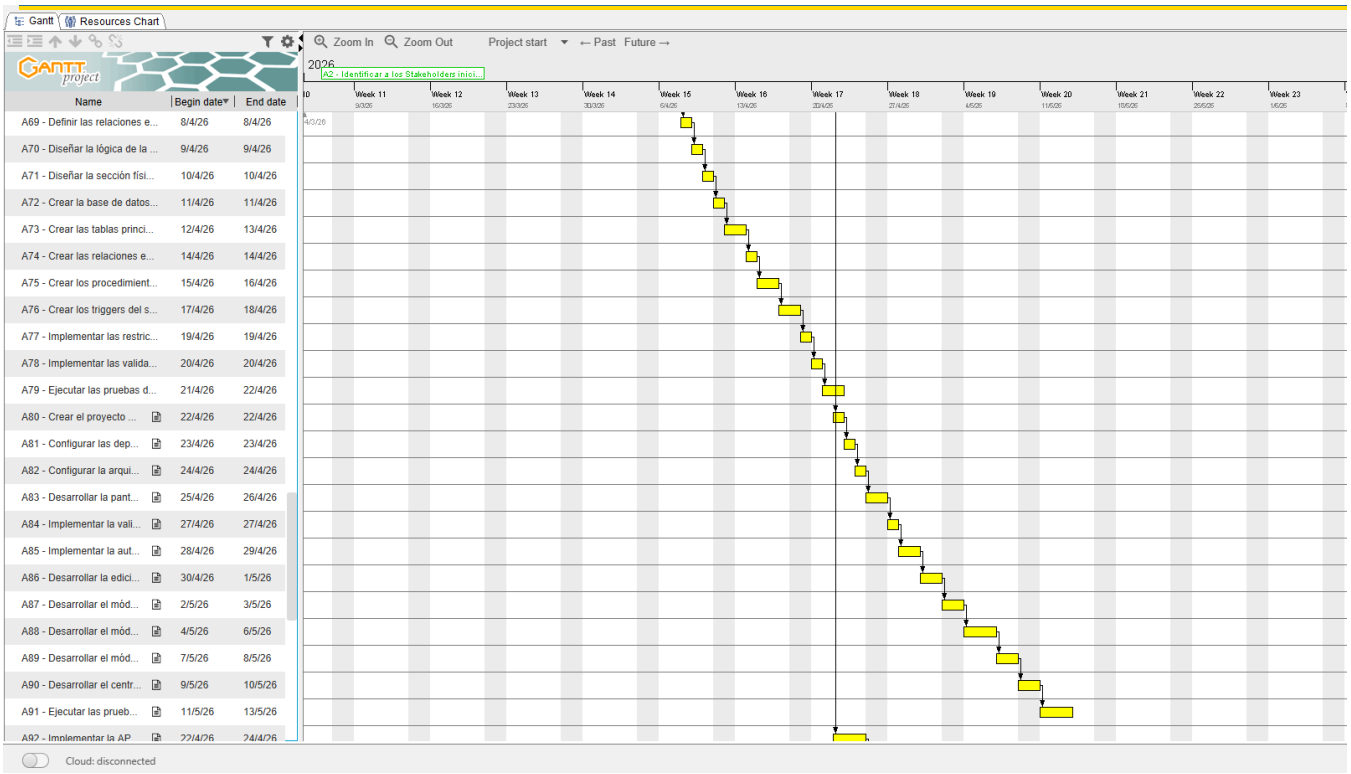
Gantt
Resources Chart
Zoom In
Zoom Out
Project start
← Past
Future →
2026
A2 - Identificar a los Stakeholders inici...
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22
Week 23
Name
Begin date
End date
A69 - Definir las relaciones e... 8/4/26 8/4/26
A70 - Diseñar la lógica de la ... 9/4/26 9/4/26
A71 - Diseñar la sección físi... 10/4/26 10/4/26
A72 - Crear la base de datos... 11/4/26 11/4/26
A73 - Crear las tablas princi... 12/4/26 13/4/26
A74 - Crear las relaciones e... 14/4/26 14/4/26
A75 - Crear los procedimient... 15/4/26 16/4/26
A76 - Crear los triggers del s... 17/4/26 18/4/26
A77 - Implementar las restric... 19/4/26 19/4/26
A78 - Implementar las valida... 20/4/26 20/4/26
A79 - Ejecutar las pruebas d... 21/4/26 22/4/26
A80 - Crear el proyecto ... 22/4/26 22/4/26
A81 - Configurar las dep... 23/4/26 23/4/26
A82 - Configurar la arqui... 24/4/26 24/4/26
A83 - Desarrollar la pant... 25/4/26 26/4/26
A84 - Implementar la vali... 27/4/26 27/4/26
A85 - Implementar la aut... 28/4/26 29/4/26
A86 - Desarrollar la edici... 30/4/26 1/5/26
A87 - Desarrollar el mód... 2/5/26 3/5/26
A88 - Desarrollar el mód... 4/5/26 6/5/26
A89 - Desarrollar el mód... 7/5/26 8/5/26
A90 - Desarrollar el centr... 9/5/26 10/5/26
A91 - Ejecutar las prueb... 11/5/26 13/5/26
A92 - Implementar la AP... 22/4/26 24/4/26
Cloud: disconnected

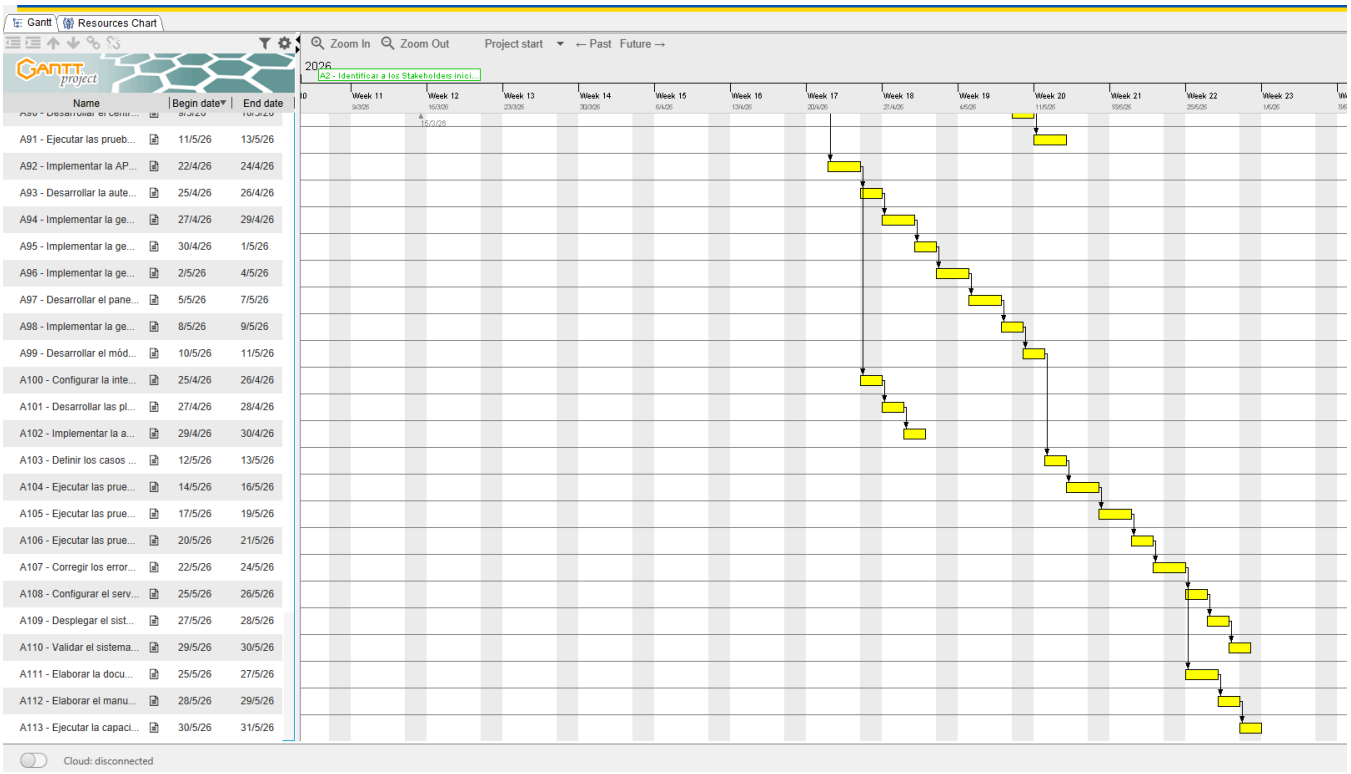
Gantt
Resources Chart
Zoom In
Zoom Out
Project start
← Past
Future →
2026
A2 - Identificar a los Stakeholders inici...
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22
Week 23
Name
Begin date
End date
A91 - Ejecutar las prueb... 11/5/26 13/5/26
A92 - Implementar la AP... 22/4/26 24/4/26
A93 - Desarrollar la aute... 25/4/26 26/4/26
A94 - Implementar la ge... 27/4/26 29/4/26
A95 - Implementar la ge... 30/4/26 1/5/26
A96 - Implementar la ge... 2/5/26 4/5/26
A97 - Desarrollar el pane... 5/5/26 7/5/26
A98 - Implementar la ge... 8/5/26 9/5/26
A99 - Desarrollar el mód... 10/5/26 11/5/26
A100 - Configurar la inte... 25/4/26 26/4/26
A101 - Desarrollar las pl... 27/4/26 28/4/26
A102 - Implementar la a... 29/4/26 30/4/26
A103 - Definir los casos ... 12/5/26 13/5/26
A104 - Ejecutar las prue... 14/5/26 16/5/26
A105 - Ejecutar las prue... 17/5/26 19/5/26
A106 - Ejecutar las prue... 20/5/26 21/5/26
A107 - Corregir los error... 22/5/26 24/5/26
A108 - Configurar el serv... 25/5/26 26/5/26
A109 - Desplegar el sist... 27/5/26 28/5/26
A110 - Validar el sistema... 29/5/26 30/5/26
A111 - Elaborar la docu... 25/5/26 27/5/26
A112 - Elaborar el manu... 28/5/26 29/5/26
A113 - Ejecutar la capaci... 30/5/26 31/5/26
Cloud: disconnected
